



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

INFORME PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2019 DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DIRECCION DE INGENIERÍA Y PROYECTOS Informe Proyectos de Inversión, 4to Trimestre 2019

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Monto Ejecutado 4to trimestre RDS		
		Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Tanque regulador acero vitrificado en Hato del Yaque, Acueducto Ciudad Juan Bosch-La Canela	\$ 74.801.249,56	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, Dicción GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	\$ 12.239.278,38	\$ 2.053.451,48	\$ -	\$ 3.614.161,55
Adecuación de la Oficina para el Equipo de Proyectos para PROMESAPS	\$ 8.491.853,63	\$ 871.539,98	\$ 511.894,90	\$ 669.851,60
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote II	\$ 2.623.079,93	\$ 624.614,78	\$ -	\$ -
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote I	\$ 5.047.706,41	\$ -	\$ 2.205.815,32	\$ -

Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote IV	\$ 4.954.316,37	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote III	\$ 2.499.549,03	\$ -	\$ -	\$ -
Sustitución de Alcantarillado tramo paralelo Arroyo Bambú, Urb. Thomén	\$ 1.072.558,40	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de tubería de Agua Potable, Calle Chantini desde Av. Rafael Vidal hasta Carretera Duarte	\$ 11.659.179,90	\$ -	\$ -	\$ 16.817.148,63
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	\$ 68.473.817,84	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	\$ 64.625.927,67	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote I Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	\$ 105.412.409,25	\$ -	\$ -	\$ 35.449.186,02
Construcción desvío de tubería agua residual, av. Hatuey calle J, Los Reyes	\$ 699.256,16	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$ 27.690.901,84	\$ 4.510.458,75	\$ -	\$ -
Instalación Tubería y Accesorios en Gurabo.	\$ 121.630.066,25	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	\$ 11.669.922,54	\$ -	\$ -	\$ 741.300,34
Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$ 15.204.204,05	\$ -	\$ 5.464.778,17	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$ 26.933.386,82	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I	\$ 39.494.208,74	\$ -	\$ -	\$ 3.063.881,82
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$ 34.046.853,61	\$ -	\$ -	\$ -

Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	\$ 67.000.000,00	\$ 2.555.096,18	\$ -	\$ 2.977.983,49
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	\$ 85.028.423,04	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	\$ 79.924.859,15	\$ -	\$ 13.136.572,67	\$ -
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	\$ 1.712.280.412,00	\$ -	\$ 189.250.777,86	\$ -
Construcción Muro de Gaviones Tamboril	\$ 4.127.083,25	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción Edificio de un (1) nivel, Oficina periférica Cienfuegos	\$ 7.300.073,54	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción Tubería Agua Residual Residencial Sahara Etapa II	\$ 1.375.186,49	\$ -	\$ -	\$ -
Reforzamiento laboratorio Planta de Tratamiento Aguas Residuales Rafey II y III.	\$ 1.179.857,73	\$ -	\$ -	\$ -
Remodelación de la Oficina Periferica Bella Vista, Santiago	\$ 1.437.563,76	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación Tubería P.V.C. etapa 1	\$ 32.422.482,73	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de Línea de Agua Potable para conformación de macrosectores (Lotes 1,2 y 3)	\$ 47.333.851,73	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción tubería agua potable Calle Los Céspedes, Yaguita del Pastor, parte A y Construcción tubería agua potable Calle Las Palmas, La Paloma, parte B	\$ 227.523,03	\$ 373.414,39	\$ -	\$ -
Construcción de Tubería de Agua Potable Barrio La Islita Etapa I La Herradura Santiago	\$ 835.419,27	\$ -	\$ 1.041.437,78	\$ -
Construcción de Tubería de Agua Potable Barrio La Islita Etapa II La Herradura Santiago	\$ 925.346,73	\$ -	\$ 935.601,80	\$ -
Montos mensuales		\$ 10.988.575,56	\$ 212.546.878,50	\$ 63.333.513,45
Monto total del Primer trimestre				\$ 286.868.967,51

Anexos.
Tabla I.


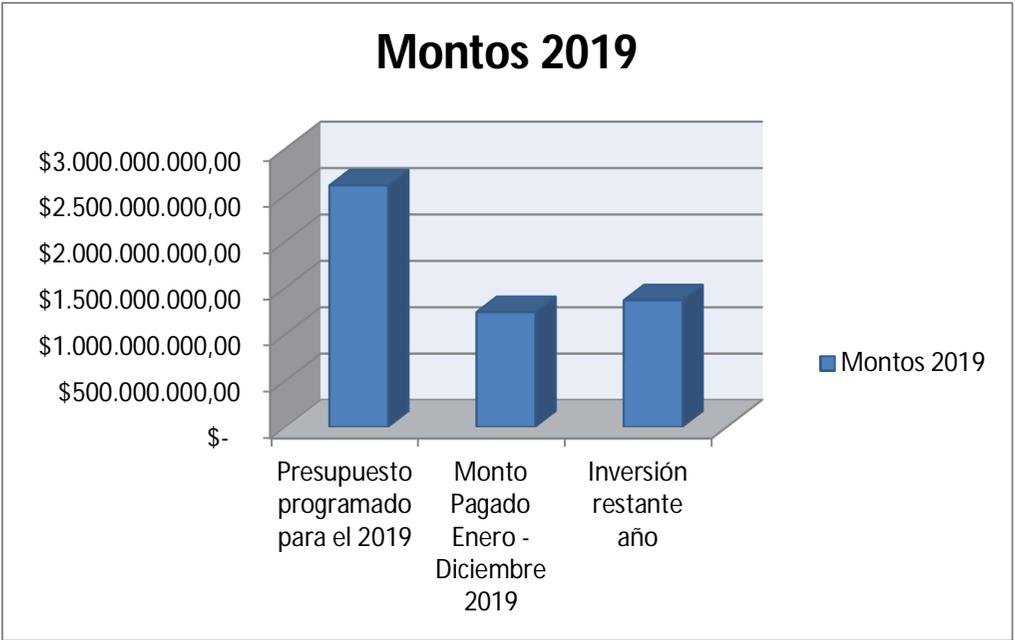



Tabla II.




Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos

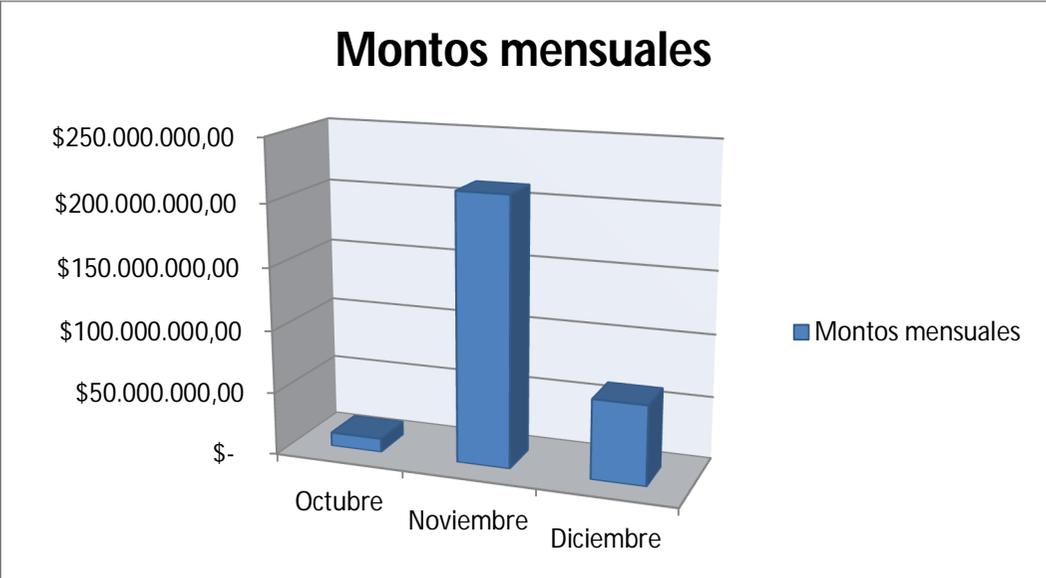

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programas y Proyectos Especiales



Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y Proyectos
