




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

INFORME PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2019 DIRECCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS Informe Proyectos de Inversión, 2do Trimestre 2019

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Monto Ejecutado 1er trimestre RDS			Monto Ejecutado 2do trimestre RDS		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, Dicción GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	\$ 12.239.278,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adecuación de la Oficina para el Equipo de Proyectos para PROMESAPS	\$ 8.491.853,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote II	\$ 2.623.079,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote I	\$ 5.047.706,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.009.541,28
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote IV	\$ 4.954.316,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990.863,28
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote III	\$ 2.499.549,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.909,81
Sustitución de Alcantarillado tramo paralelo Arroyo Bambú, Urb. Thomén	\$ 1.072.558,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.650,02	\$ -
Construcción de tubería de Agua Potable, Calle Chantini desde Av. Rafael Vidal hasta Carretera Duarte	\$ 11.659.179,90	\$ -	\$ -	\$ 4.185.188,09	\$ 1.628.266,44	\$ 2.317.334,44	\$ 1.757.518,28
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	\$ 68.473.817,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	\$ 64.625.927,67	\$ -	\$ -	\$ 24.141.529,74	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote L Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	\$ 105.412.409,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.586.193,37	\$ 8.839.894,11
Construcción desvío de tubería agua residual, av. Hatuey calle J, Los Reyes	\$ 699.256,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.030,57	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$ 27.690.901,84	\$ -	\$ 5.686.627,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación Tubería y Accesorios en Gurabo.	\$ 121.630.066,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.469.424,27	\$ 8.379.929,70
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	\$ 11.669.922,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.384,93	\$ -

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$ 15.204.204,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.766.967,10	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$ 26.933.386,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.743.723,51	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I	\$ 39.494.208,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$ 34.046.853,61	\$ -	\$ -	\$ 3.480.408,11	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	\$ 67.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 166.598,67	
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumil.	\$ 85.028.423,04	\$ -	\$ 66.575,87	\$ -	\$ -	\$ -	
Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	\$ 79.924.859,15	\$ 14.703.418,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.679.071,07
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	\$ 1.712.280.412,00	\$ -	\$ -	\$ 122.411.385,80		\$ 2.845.108,61	\$ 264.547.305,20
Construcción Muro de Gaviones Tamboril	\$ 4.127.083,25	\$ 3.793.957,30	\$ -	\$ -			
Construcción Edificio de un (1) nivel, Oficina periférica Cienfuegos	\$ 7.300.073,54	\$ -	\$ -	\$ 3.396.375,91			
Construcción Tubería Agua Residual Residencial Sahara Etapa II	\$ 1.375.186,49	\$ -	\$ -	\$ 814.770,40			
Reforzamiento laboratorio Planta de Tratamiento Aguas Residuales Rafey II y III	\$ 1.179.857,73	\$ 552.693,80	\$ -	\$ 564.795,32			
Remodelación de la Oficina Periférica Bella Vista, Santiago	\$ 1.437.563,76	\$ -	\$ 660.550,27	\$ -		\$ 644.329,35	
Instalación Tubería P.V.C. etapa 1	\$ 32.422.482,73	\$ -	\$ 2.180.330,58	\$ 451.469,74			
Construcción de Línea de Agua Potable para conformación de macrosectores (Lotes 1,2 y 3)	\$ 47.333.851,73	\$ -	\$ 1.746.697,77	\$ 284.627,70			
Montos mensuales		\$ 19.050.069,57	\$ 10.340.782,44	\$ 159.730.550,81	\$ 5.966.987,62	\$ 19.768.373,64	\$ 302.203.718,36
Monto total del Primer trimestre		\$	\$	189.121.402,82	\$		327.939.079,62

Preparado por:

 Ing. Massiel Mejía L.
 Asist. Director Ingeniería



Aprobado por:

 Ing. Fidel Rivas
 Director de Ingeniería y Proyectos

Anexos.
Tabla I.

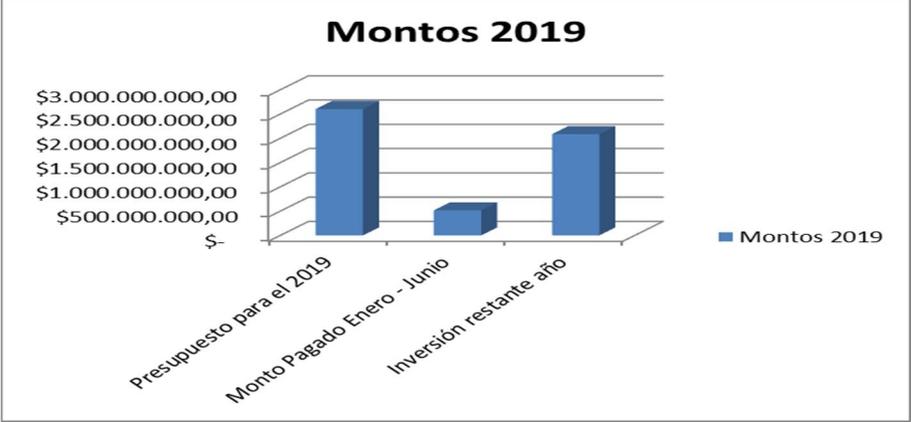


Tabla II.

